

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ประไพกิจก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๓/๖ หมู่ ๒ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี โดยนายสุรชัย กังวลกิจ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๘๐๐๑๔๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔-แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายโรงไฟฟ้าย่อย - ถนนสาย ๓๓๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ บริษัท ประไพกิจก่อสร้าง จำกัด ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

-ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๑๕๐ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๓๐,๓๒๓ บาท (เจ็ดหมื่นสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ข้อ ๒ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง
(นายสุรชัย กังวลกิจ)



(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางวิรานุรัช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)


ตารางการคิดคำนวณค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

กรณีที่ 2 สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563

2.2 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วิธีคำนวณ

สัญญาก่อสร้างลงนามวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มูลค่าสัญญา 28,129,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ค่าปรับร้อยละ 0.25 เป็นจำนวน 70,323 บาท/วัน

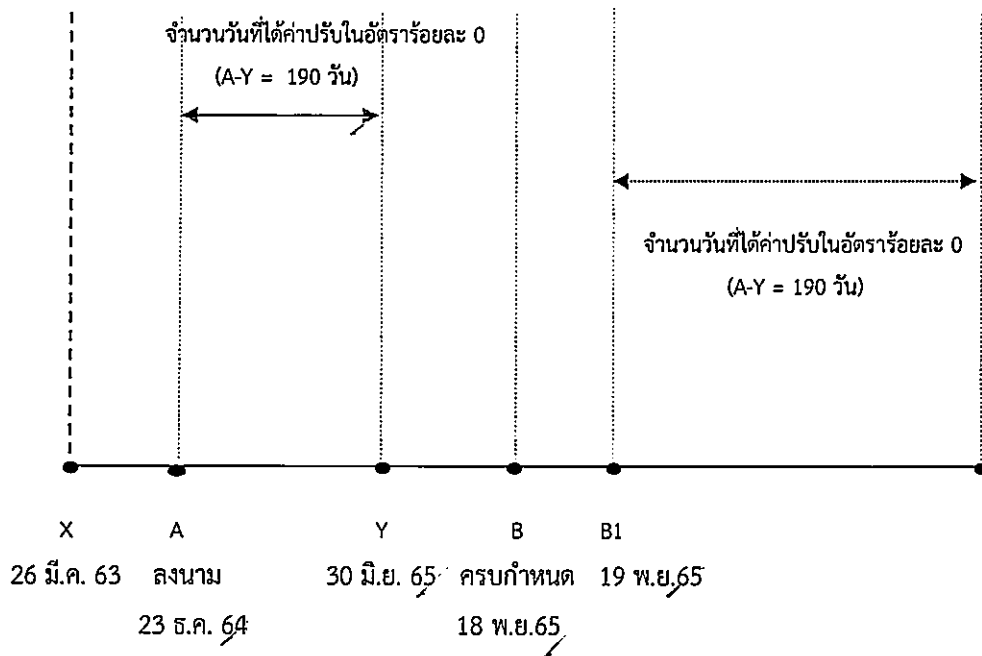

1.จำนวนวันที่คิดค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564-30 มิถุนายน 2565 (A-Y) เป็นจำนวน 190 วัน
